



*Elämän  
tähden*

# Tietohallinnon projektitoimisto erikoisterveydenhoidossa

**TTY projektinhallintapäivä  
7.6.2017 Pasi Laurila/PSHP**


# PSHP

- PSHP:n IT
- IT –toimittajat ja niiden hallinta
- Projektitoimisto ja PMO:n rooli ja tehtävät
- Projektisalkun sisältöä

# PSHP

Coxa, Syke, Fimlab, Aku

- Vuosittain n. 190 000 eri potilasta
  - Vuodeosastoilla 75 000 ja poliklinikoilla 370 000 käyntiä
- 7 900 työntekijää
- 755 M€
- 6 500 työasemaa
- 450 eri järjestelmää
- 1 900 verkon aktiivilaitetta
- 16 000 lääkintälaitetta / 2 000 verkossa

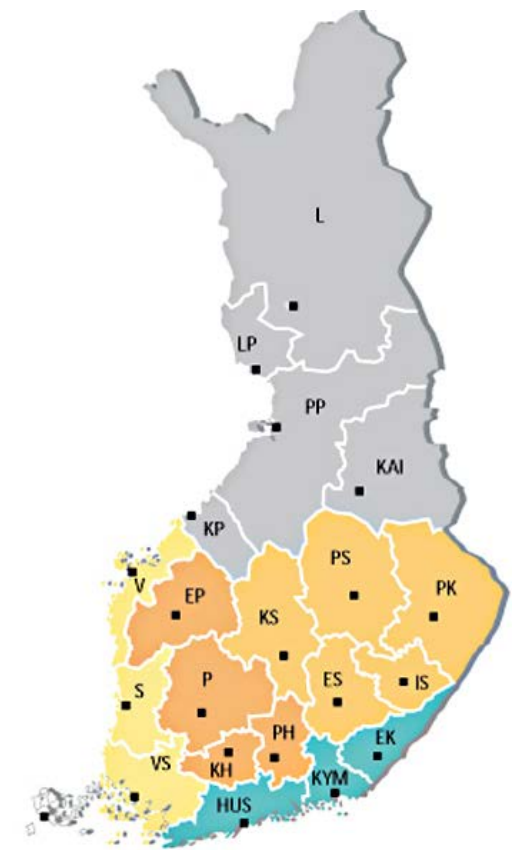

- HYKS erva  
Helsinki ja Uusimaa (HUS)  
Etelä-Karjala (EK)  
Kymenlaakso (KYM)
- TAYS erva  
Pirkanmaa (P)  
Etelä-Pohjanmaa (EP)  
Kanta-Häme (KH)  
Päijät-Häme (PH)
- KYS erva  
Pohjois-Savo (PS)  
Etelä-Savo (ES)  
Itä-Savo (IS)  
Keski-Suomi (KS)  
Pohjois-Karjala (PK)
- TYKS erva  
Vaasa (V)  
Varsinais-Suomi (VS)  
Satakunta (S)
- OYS erva  
Pohjois-Pohjanmaa (PP)  
Lansi-Pohja (LP)  
Lappi (L)  
Kainuu (KAI)  
Keski-Pohjanmaa (KP)
- Keskussairaaloiden sijaintikunnat

# PSHP organisaatio

Valtuusto

Hallitus


Yhtymähallinto

Palvelukeskus

Tietohallinto

PMO


# PSHP organisaatio

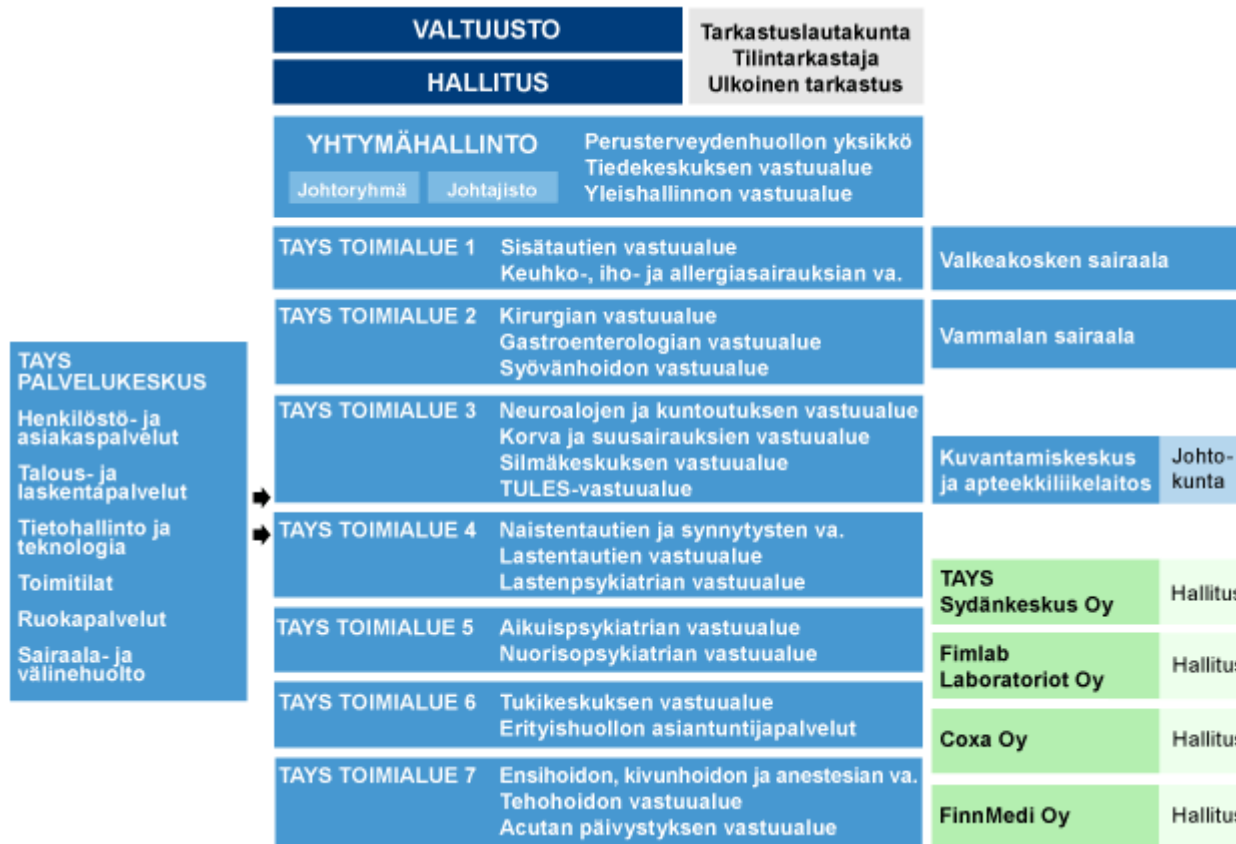


# PSHP ICMT -palvelut

→ 31.12.2016

- ICMT sopimukset siirrettiin Istekille 1.1.2017 alkaen  
→ vuoden alusta ICMT -palveluiden järjestämis- ja tuottamisvastuu on Istekillä

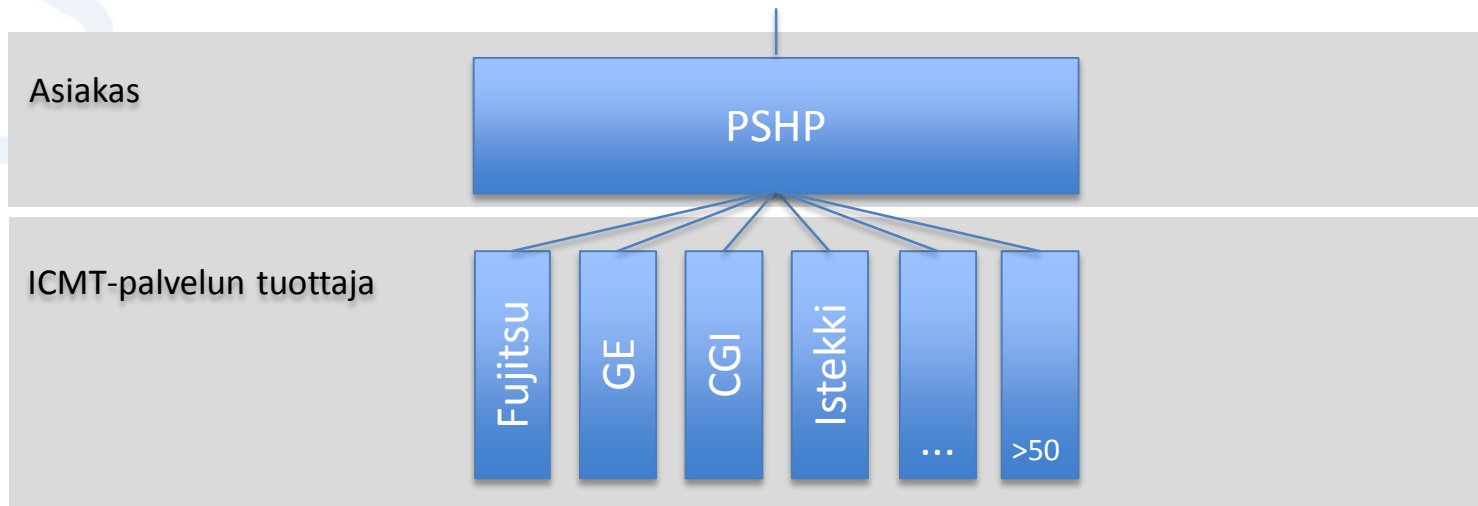

# PSHP IT –Mitä jäi jäljelle?




# Hallintomalli ja prosessit

Hallintomallin tasot





# Hallintomalli ja prosessit

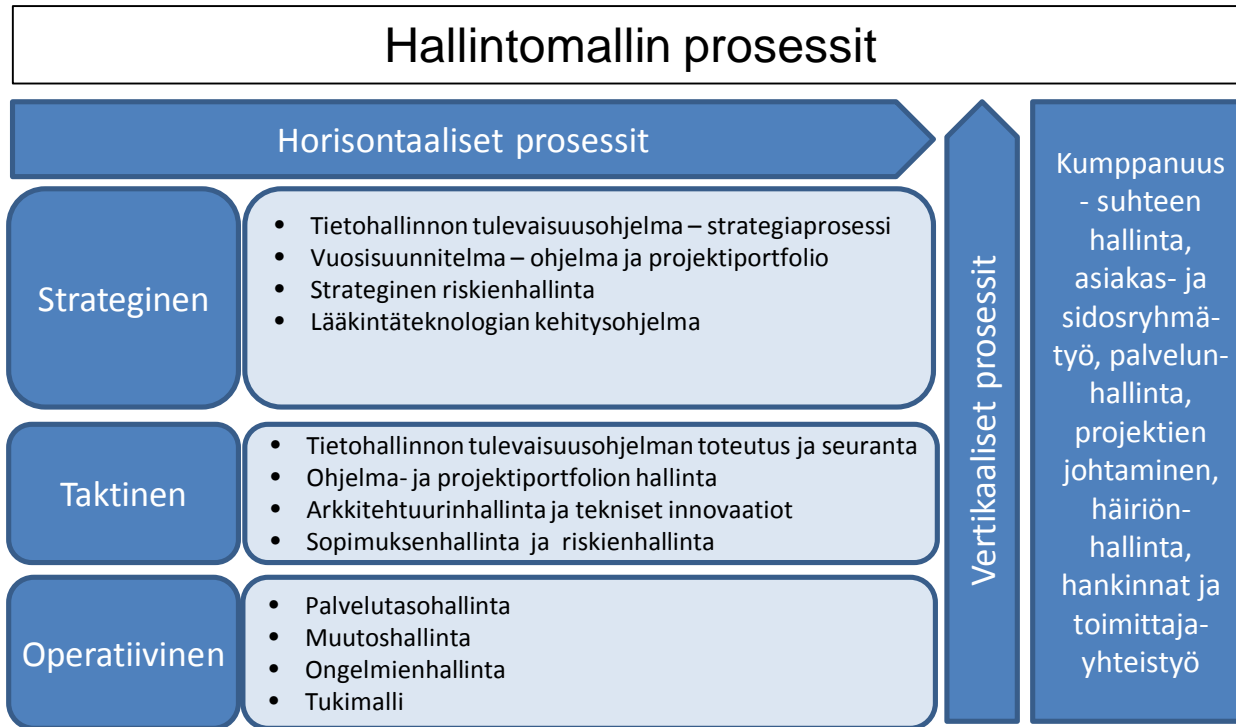

# Johtamisen periaatteita

Periaate	Tavoite	Haaste
Keskitetty ict-hallinta, ei hajautettu	Kustannusten ja laadun säilyttäminen	Reagointi toiminnan tarpeisiin voi olla liian hidasta. Syntyy ”varjo-IT”
PSHP:n tietohallinto ei osallistu operatiiviseen toimintaan	Päällekkäisyyksien vähentäminen, selkeät roolit ja vastuut, ajankäytön tehostuminen	Poisoppiminen vanhasta, selkeät tehtäväkuvat

# Projektien keskeiset foorumit

PSHP

PSHP-Istekki

Istekki

Strateginen  
”Kumppanuuden  
kehittäminen”

Tietohallinnon ohjausryhmä

Taktinen  
”Palvelun jatkuva  
parantaminen”

Tietohallinnon vastualueen johtoryhmä

ICMT / tietohallintopalvelut / tietojärjestelmät / tietopalvelut


PMO kokous (koko PSHP projektisalkku)

Operatiivinen  
”Häiriötön  
päivittäinen  
toiminta”



Projektin OHRY

Projektikokoukset

# Projektin ohjaus

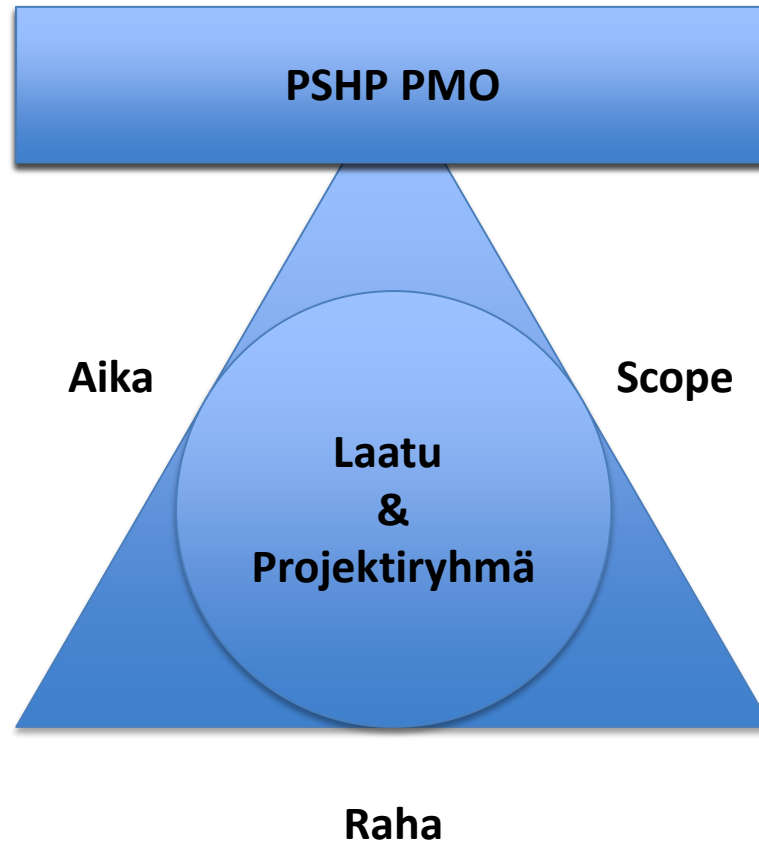

# PSHP Projektitoimisto / PMO

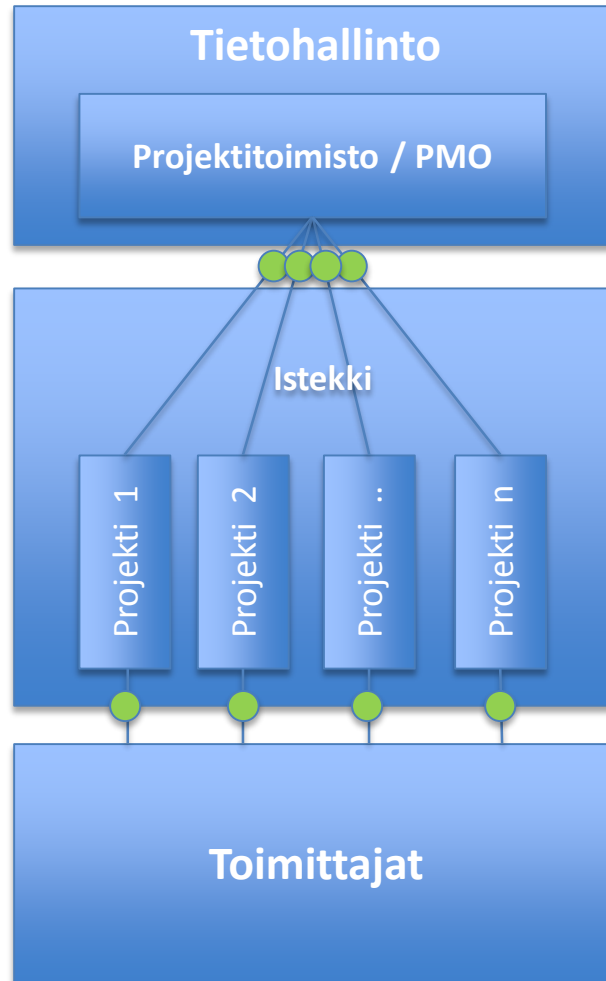

● Sopimus

# PMO tehtäviä & vastuita

## Avustava rooli


- Kehittämisesitykset
- Teknologiaavalinnat
- Tarjoukset
- Tilaukset
- Sopimukset

+

## Toteuttava rooli

- Sopimukset
  - Keskitetty sopimusten hallinta
- Tilaukset
- Priorisointi
- Budjetointi
- Resursointi

# TIHA & Digi projektisalkut

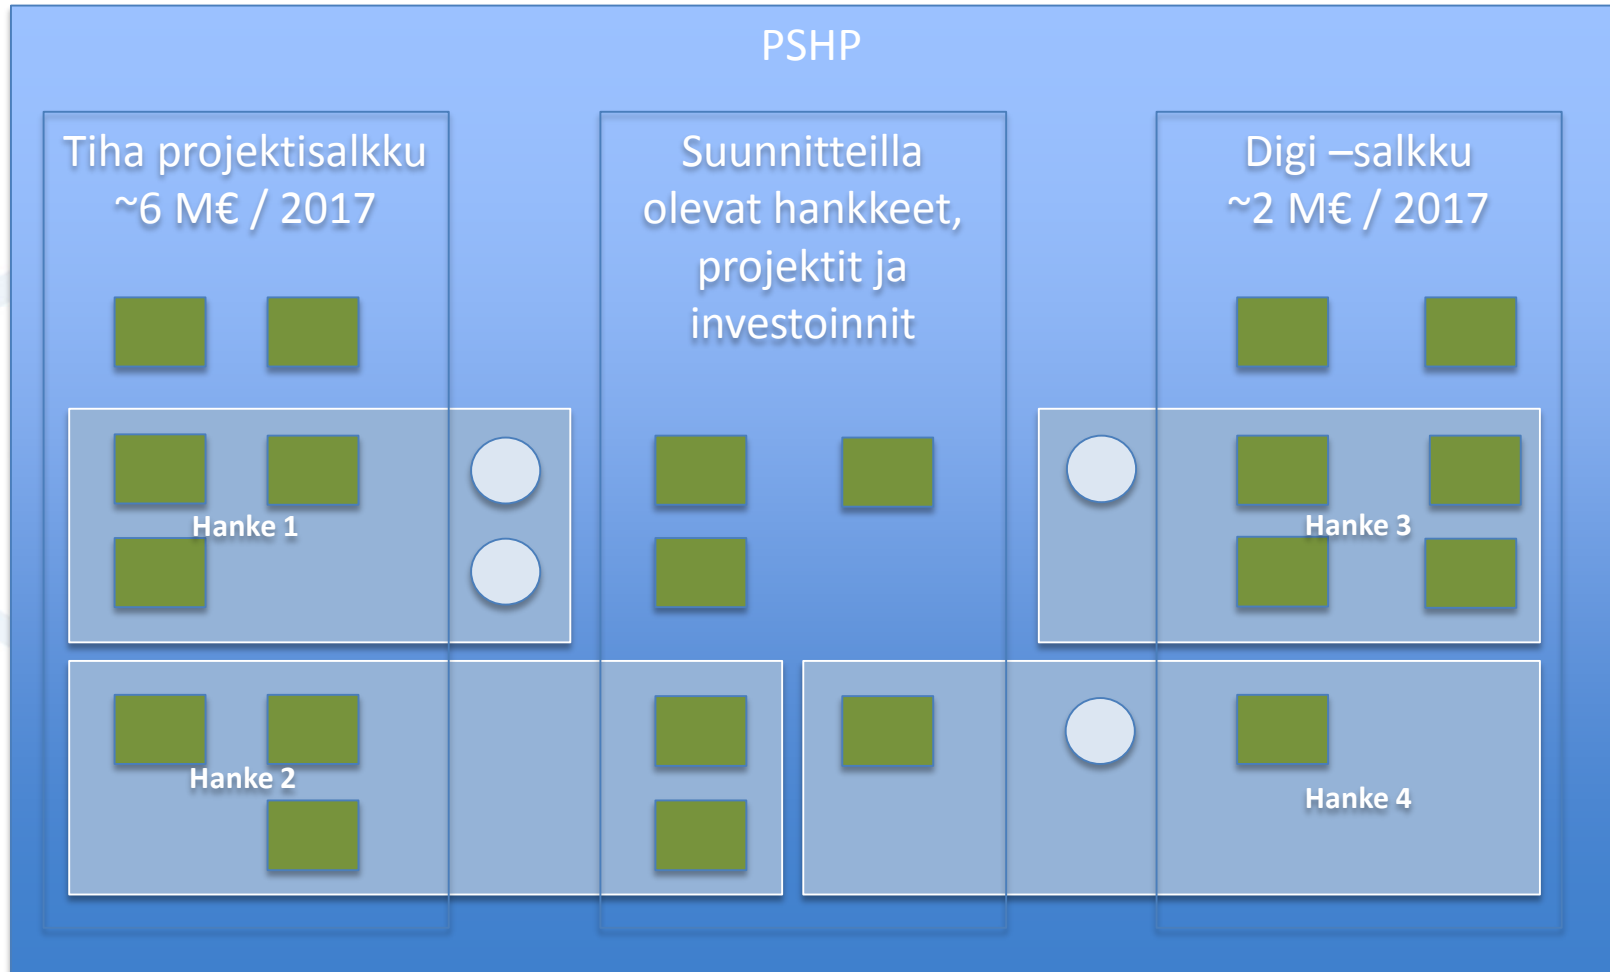

**Projekti**





**Hanke**





**Muutos / Pienkehitys**





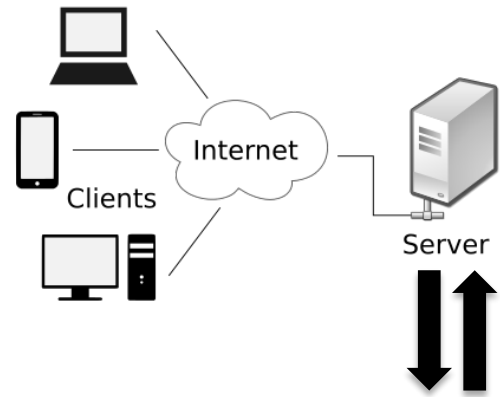



**WiFi**

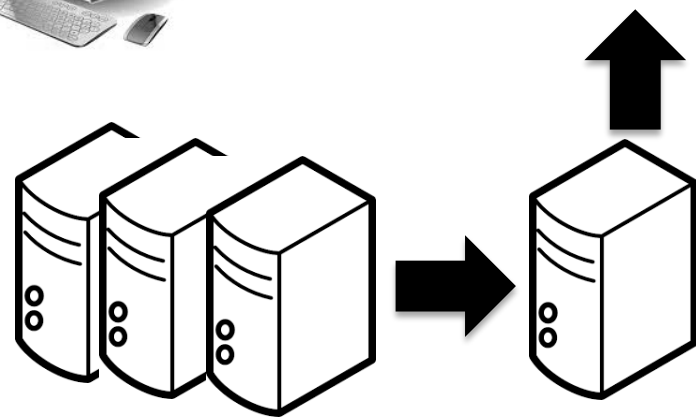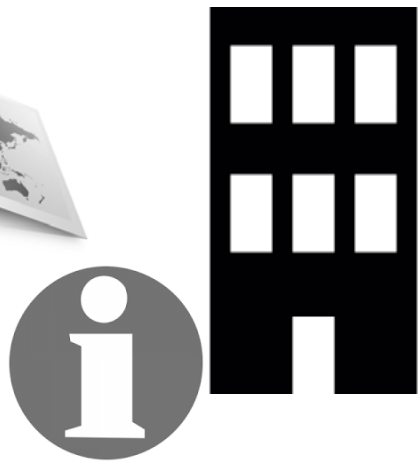



# 2017 / 2018

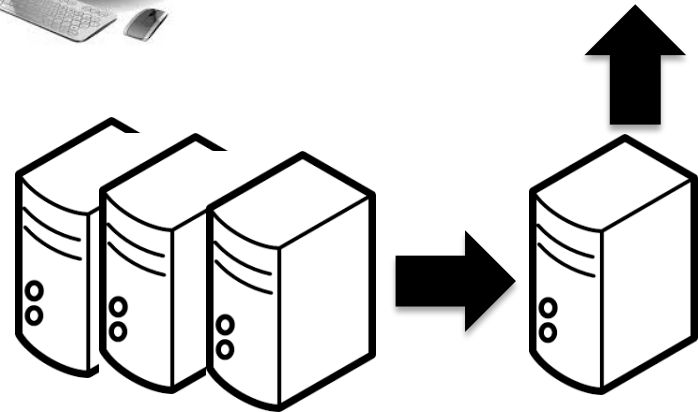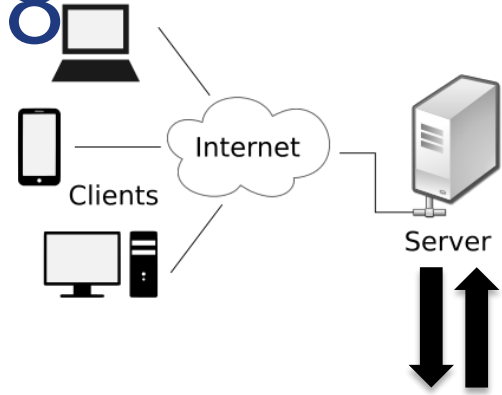

# Yhteenvetoa

- IoT
  - Verkossa jo 2000 lääkintälaitetta / 16 000 laitteen kokonaispotentiaali
- Digitalisaatiota
  - Digisanelu ✘
  - Puheentunnistus ✔
- Onnistuneita projekteja
  - Tietohallinnon ulkoistus Istekille
    - *Oman ajankäytön tehostuminen, aikaa kommunikaatiolle ja kehittämiselle*
    - *IT projektisalkku tiukasti omassa hallussa jatkossakin*
  - PMO toiminnan jatkokehittäminen

**Kiitos!**
